


ID	Režim úkolu	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Název zdrojů
0		0	ORP - optimalizace resource planu	176 dny	25.06.18	08.03.19		
1		1	Fáze přípravy a výběru řešení (Předprojektová fáze)	47 dny	25.06.18	28.08.18		
2		1.1	Konkretizace zadání	21 dny	25.06.18	23.07.18		
3		1.1.1	Revize aktuálního stavu	10 dny	25.06.18	06.07.18		
4		1.1.2	Definice požadavků/očekávání	4 dny	09.07.18	12.07.18		
5		1.1.2.1	Rozhovor s Project Portfolio Manažerem	1 den	09.07.18	09.07.18	3	Matěj Gosman[25%
6		1.1.2.2	Uspořádání workshopu pro projektové manažery	3 dny	10.07.18	12.07.18	3	
7		1.1.2.2.1		1 den	10.07.18	10.07.18	5	Matěj Gosman
8		1.1.2.2.2	Rezervace prostor	1 den	11.07.18	11.07.18	7	Matěj Gosman[50%
9		1.1.2.2.3	Realizace	1 den	12.07.18	12.07.18	8	Project Manager 1
10		1.1.3	Zpracování požadavků/očekávání	7 dny	13.07.18	23.07.18		
11		1.1.3.1	Konsolidace potřeb a požadavků	5 dny	13.07.18	19.07.18	4	Matěj Gosman[50%
12		1.1.3.2	Prioritizace požadavků	2 dny	20.07.18	23.07.18	11	Matěj Gosman[50%
13		1.2	Rešerše možných variant řešení	22 dny	24.07.18	22.08.18		
14		1.2.1	Internetový průzkum	5 dny	24.07.18	30.07.18	2	Matěj Gosman[40%
15		1.2.2	WS na téma "best practice" v resource managementu externí firmou	22 dny	24.07.18	22.08.18		
16		1.2.2.1	Poptávka školících firem	10 dny	24.07.18	06.08.18	2	Matěj Gosman[20%
17		1.2.2.2	Posouzení nabídek	4 dny	07.08.18	10.08.18	16	Matěj Gosman[13%
18		1.2.2.3	Firma vybrána	0 dny	10.08.18	10.08.18	17	
19		1.2.2.4	Příprava workshopu	8 dny	13.08.18	22.08.18		
20		1.2.2.4.1	Prostory	3 dny	13.08.18	15.08.18	18	Matěj Gosman[33%
21		1.2.2.4.2	Termín	3 dny	16.08.18	20.08.18	20	Matěj Gosman[50%
22		1.2.2.4.3	Objednávka	1 den	21.08.18	21.08.18	21	Matěj Gosman[38%
23		1.2.2.4.4	Realizace WS externí agenturou	1 den	22.08.18	22.08.18	22	Externí školitel;Ma
24		1.3	Výběr finální varianty řešení	4 dny	23.08.18	28.08.18		
25		1.3.1	Vytvoření prezentace možných řešení	3 dny	23.08.18	27.08.18	13	Matěj Gosman[33%
26		1.3.2	Prezentace variant Project Portfolio Manažerovi	1 den	28.08.18	28.08.18	25	Matěj Gosman[25%
27		1.3.3	Varianta vybrána	0 dny	28.08.18	28.08.18	26	
28		2	Projektová dokumentace (Fáze plánování)	18 dny	29.08.18	21.09.18		
29		2.1	Tvorba projektové dokumentace	14 dny	29.08.18	17.09.18		
30		2.1.1	Tvorba Organizační struktury	2 dny	29.08.18	30.08.18	1	Matěj Gosman[25%
31		2.1.2	Tvorba PBS	2 dny	31.08.18	03.09.18	30	Matěj Gosman[25%
32		2.1.3	Tvorba Harmonogramu	10 dny	04.09.18	17.09.18		
33		2.1.3.1	Definice časování dodávek (časový plán)	5 dny	04.09.18	10.09.18	31	Matěj Gosman[40%
34		2.1.3.2	Definice kapacitních potřeb	3 dny	11.09.18	13.09.18	33	Matěj Gosman[33%
35		2.1.3.3	Konzultace s IT - alokace kapacit u managementu	1 den	14.09.18	14.09.18	34	Matěj Gosman[25%
36		2.1.3.4	Tvorba high-line časové osy (prezentační vrstva)	1 den	17.09.18	17.09.18	35	Matěj Gosman[50%
37		2.2	Předložení projektové dokumentace	1 den	18.09.18	18.09.18	29	
38		2.3	Schválení projektové dokumentace	3 dny	19.09.18	21.09.18	37	
39		2.4	Projektová dokumentace schválena	0 dny	21.09.18	21.09.18	38	
40		3	Fáze realizace vybraného řešení (Fáze realizace)	111 dny	24.09.18	08.03.19		
41		3.1	Zadání pro vývoj	15 dny	24.09.18	12.10.18		
42		3.1.1	Specifikace požadavků	5 dny	24.09.18	28.09.18	27;39	Matěj Gosman[70%
43		3.1.2	Tvorba zadávací dokumentace	5 dny	01.10.18	05.10.18	42	Matěj Gosman[70%
44		3.1.3	Vyjasnění požadavků s hlavním vývojářem	5 dny	08.10.18	12.10.18	43	Matěj Gosman[20%
45		3.1.4	Finální zadání předáno	0 dny	12.10.18	12.10.18	44	
46		3.2	Solution design	7 dny	15.10.18	23.10.18		
47		3.2.1	Vytvoření návrhu řešení vývojářem	5 dny	15.10.18	19.10.18	45	Vývojář 1[60%]
48		3.2.2	Vyjasnění návrhu	2 dny	22.10.18	23.10.18	47	Vývojář 1[38%];Ma
49		3.2.3	Akceptace návrhu	0 dny	23.10.18	23.10.18	48	
50		3.3	Vývoj	23 dny	24.10.18	23.11.18		
51		3.3.1	Vývoj nástroje	20 dny	24.10.18	20.11.18	49	Vývojář 1[30%]
52		3.3.2	Nastavení přístupových oprávnění	3 dny	21.11.18	23.11.18	51	Vývojář 1[33%]
53		3.3.3	Vývoj dokončen	0 dny	23.11.18	23.11.18	52	
54		3.4	Testing	44 dny	22.10.18	20.12.18		
55		3.4.1	Příprava testů	20 dny	22.10.18	19.11.18		
56		3.4.1.1	Příprava testovacích scénářů	10 dny	22.10.18	05.11.18	57SF	Vývojář 1[10%];Ma
57		3.4.1.2	Příprava testovacích dat	10 dny	05.11.18	19.11.18	53SF-5 dny	Test manager[20%
58		3.4.2	Exekuce testů	19 dny	26.11.18	20.12.18		
59		3.4.2.1	Funkční testování + opravy chyb	12 dny	26.11.18	11.12.18	53	Test manager[25%
60		3.4.2.2	Zátěžové testování	5 dny	12.12.18	18.12.18	59	Test manager[20%
61		3.4.2.3	Zhodnocení výsledků	2 dny	19.12.18	20.12.18	60	Test manager[25%
62		3.4.2.4	Akceptace	0 dny	20.12.18	20.12.18	61	
63		3.5	Tvorba návodů	10 dny	24.10.18	06.11.18		
64		3.5.1	Tvorba návodu pro PMO a PM	5 dny	24.10.18	30.10.18	49	Matěj Gosman[50%
65		3.5.2	Tvorba návodu pro zaměstnance	5 dny	31.10.18	06.11.18	64	Matěj Gosman[40%
66		3.6	Rollout	89 dny	24.10.18	08.03.19		
67		3.6.1	Pilotní běh	69 dny	24.10.18	08.02.19		
68		3.6.1.1	Výběr vhodného oddělení pro pilot	3 dny	24.10.18	26.10.18	50SS	Test manager[13%
69		3.6.1.2	Komunikace do oddělení vybraného pro pilot	1 den	29.10.18	29.10.18	68	Department mana
70		3.6.1.3	Exekuce pilotního běhu	22 dny	03.01.19	01.02.19		
71		3.6.1.3.1	Školení liniového manažera vybraného oddělení	1 den	03.01.19	03.01.19	54;69;63	Matěj Gosman[50%
72		3.6.1.3.2	Školení zaměstnanců vybraného oddělení	1 den	04.01.19	04.01.19	71	Department mana
73		3.6.1.3.3	Pilotní běh	20 dny	07.01.19	01.02.19	72	Department mana
74		3.6.1.3.4	Pilot ukončen	0 dny	01.02.19	01.02.19	73	
75		3.6.1.4	Zhodnocení pilotu	5 dny	04.02.19	08.02.19	74	Department mana
76		3.6.2	Školení manažerů	10 dny	11.02.19	22.02.19		
77		3.6.2.1	Školení podpory PMO a PMS	5 dny	11.02.19	15.02.19	67	Project Portfolio M
78		3.6.2.2	Školení Liniových manažerů	5 dny	18.02.19	22.02.19	77	Department mana
79		3.6.3	Školení zaměstnanců	10 dny	25.02.19	08.03.19		
80		3.6.3.1	Školení liniových zaměstnanců	5 dny	25.02.19	01.03.19	78	Department mana
81		3.6.3.2	Školení projektových zaměstnanců (externisté)	5 dny	04.03.19	08.03.19	80	PMO[10%]
82		3.6.4	Spuštění do provozu	0 dny	08.03.19	08.03.19	67;76;79	

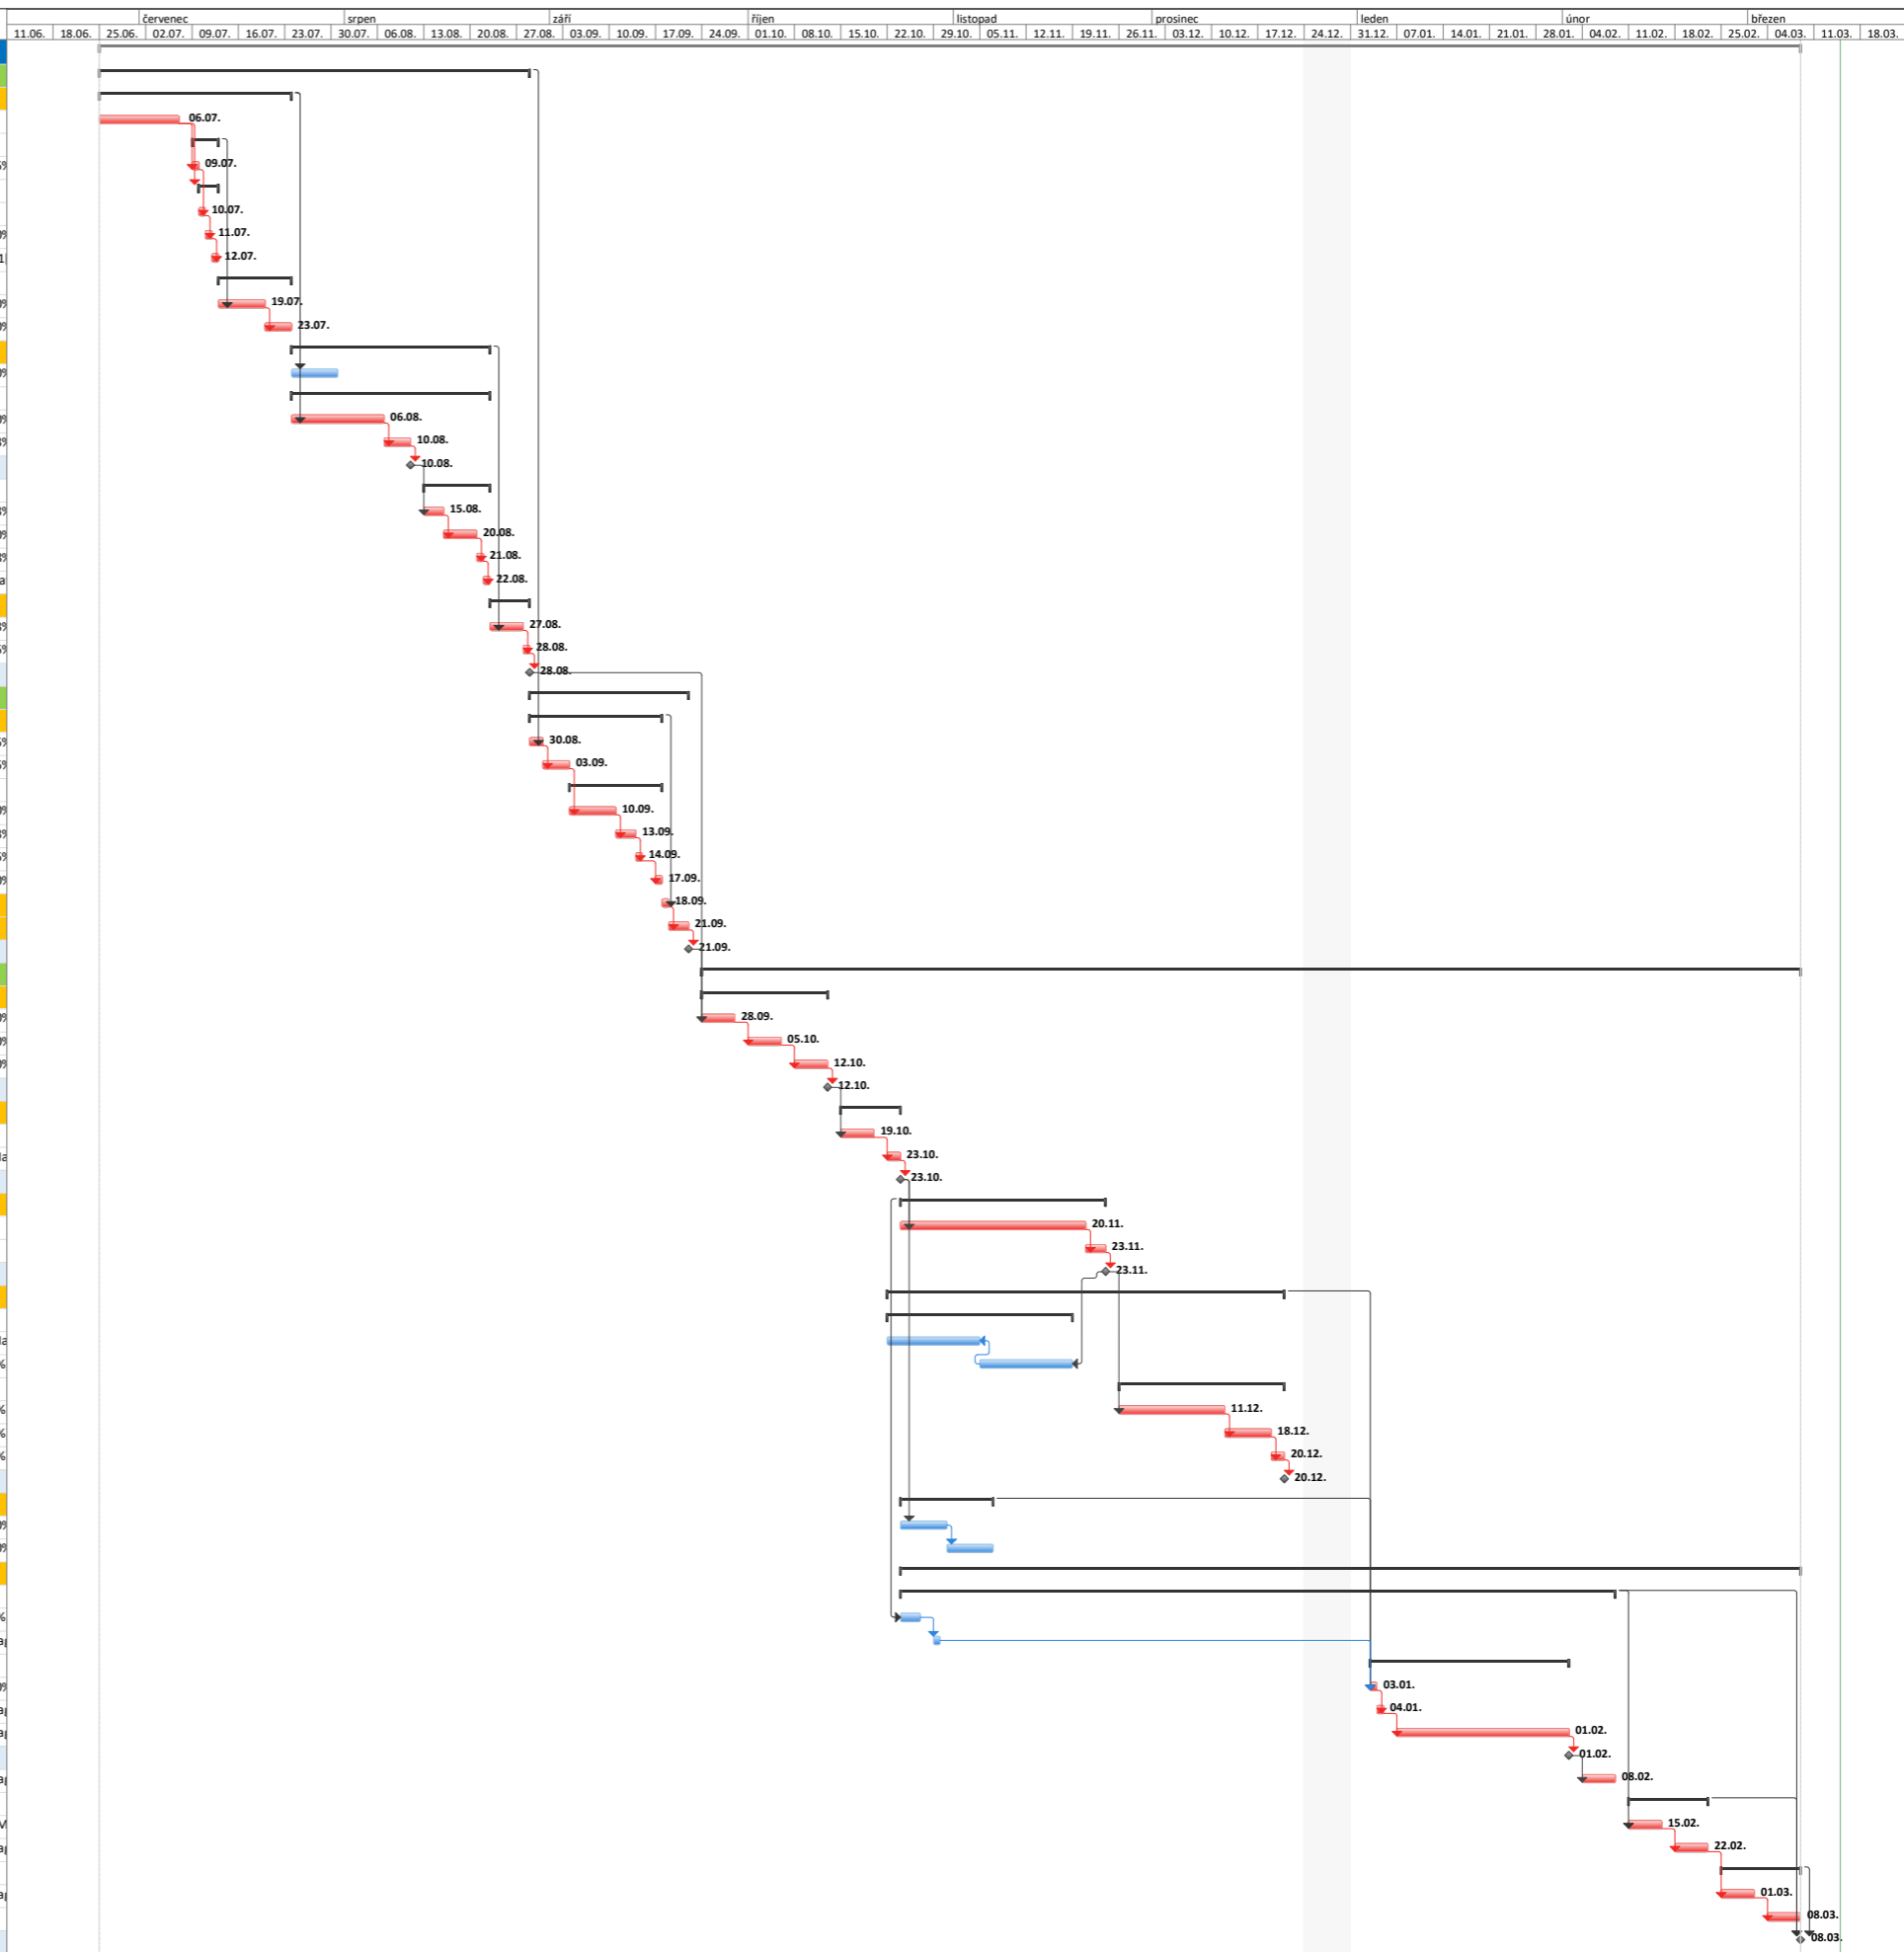

Projekt: ORP - optimalizace resou  
Datum: 15.03.19

Critical Split	..... Milník	◆	Vnější úkoly	▬	Neaktivní milník	◆	Pouze s dobou trvání	▬	Pouze s datem dokončení	▬	Kritický	▬	Manual Progress	▬
Úkol	▬	▬	Vnější milník	▬	Neaktivní souhrn	▬	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	▬	Konečný termín	▬	Kritické rozdělení	▬	Critical	▬
Rozdělení	.....	▬	Neaktivní úkol	▬	Ruční úkol	▬	Ruční souhrn	▬	Průběh	▬				

Stránka 1
